



• BAUSTOFFPRÜFSTELLE Wismar GmbH • LÜBSCHER STRASSE 109 • 23966 WISMAR •

Stadt Kröpelin  
 Der Bürgermeister  
 Markt 1  
 18236 Kröpelin

<b>Prüfbericht- Nr.:</b>	<b>1992/22</b>
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt Kröpelin
<b>Auftragsgegenstand:</b>	Ebenheitskontrollprüfung nach TP Eben - Berührende Messungen, Ausgabe 2017
<b>Bauvorhaben:</b> <b>Aktenzeichen:</b> <b>Projekt-Nr.:</b>	Ausbau der Bushaltestellen und Bahnhofstraße am Bahnhof Kröpelin ohne ohne
<b>Einbaufirma:</b>	Eurovia VBU GmbH ZS Rostock
<b>Schichtart:</b>	Asphaltdeckschicht
<b>Witterung:</b>	leicht bewölkt 13°C
<b>Messgerät:</b>	Planograf
<b>Prüfer:</b>	Herr Wendt
<b>Prüfberichtsdatum / Zeichen:</b>	24.10.2022 /Sc./We.

Der Prüfbericht umfasst 2 Seiten und 2 Anlagen.

**Messstrecke:** von Ansatz am Bauanfang bis Ansatz am Bauende

**Fahrstreifen Richtung:** Fahrtrichtung L 11 "Bützower Straße"

**Lage der Messlinie:** mittig des Fahrstreifens





<b>Datum, Uhrzeit:</b> 19.10.22 07:43	Geräte-Nummer: <b>348</b>
<b>Beginn [km]:</b> Bau-km 0+000	Datei-Nummer: <b>0836</b>
<b>Ende [km]:</b> Bau-km 0+654	Grenzwert [mm/4m]: <b>6</b>
	Streifenbreite [m]:
	Faktor Schichtart:
<b>Gesamtlänge [km]:</b> 0,6544	Einheitspreis [€/m <sup>2</sup> ):
<b>Summe p<sup>2</sup> [mm<sup>2</sup>):</b> 1185	
	Geschwindigkeit: <b>2,2 km/h</b>
	Messmethode: <b>TP Eben 2017</b>

<b>Ergebnistabelle:</b>				<b>19.10.22 07:43</b>	
Station km	Meßwert (mm)	Überschreitung p(mm)   p <sup>2</sup> (mm <sup>2</sup> )		Geschwindigkeit km/h	Kommentar
0,00118	25,63	20	400	1,2	Gefälleanbindung an "Wismarsche Straße" am Bauanfang
0,00212	13,18	7	49	0,9	Gefälleanbindung an "Wismarsche Straße" am Bauanfang
0,11071	7,83	2	4	1,0	auf Messlinie liegende Schachtabdeckung
0,13878	6,14	0,14	0	3,7	
0,21202	6,35	0,35	0	0,7	
0,28173	7,79	2	4	0,5	auf Messlinie liegende Schachtabdeckung
0,35190	8,64	3	9	0,6	auf Messlinie liegende Schachtabdeckung
0,46583	6,98	1	1	1,1	auf Messlinie liegende Schachtabdeckung
0,61677	6,48	0,48	0	2,2	
0,65190	9,10	3	9	0,8	Gefälleanbindung an "Bützower Straße" am Bauende
0,65346	20,85	15	225	1,0	Gefälleanbindung an "Bützower Straße" am Bauende
0,65425	27,63	22	484	1,1	Gefälleanbindung an "Bützower Straße" am Bauende
			1185		

  
 Peter Wendt  
 Bearbeiter



  
 Dipl.-Ing. (FH) D. Schaal  
 Leiterin der RAP Stra-Prüfstelle

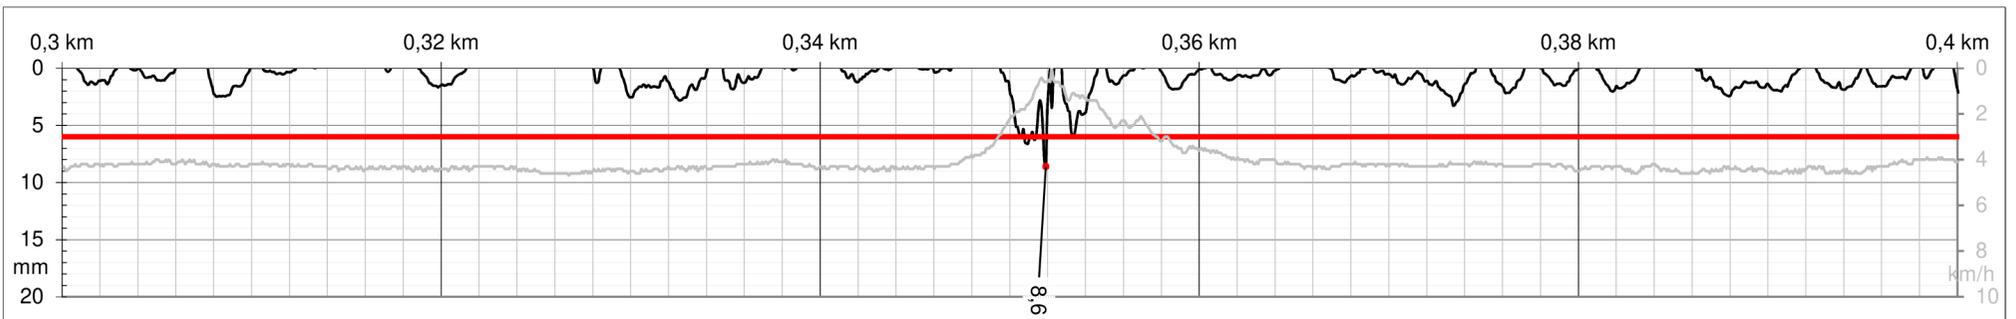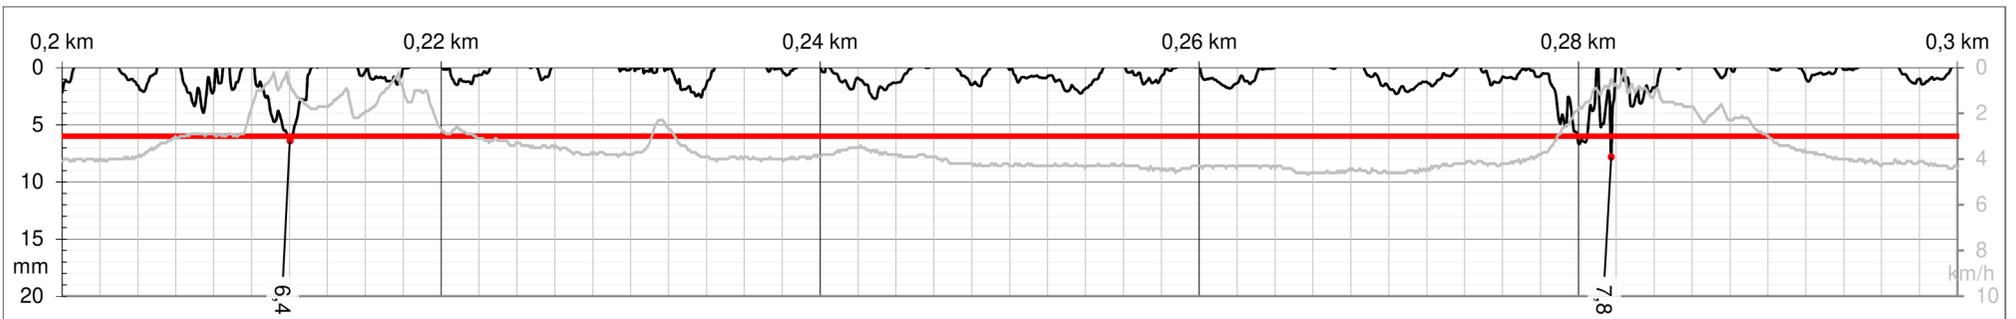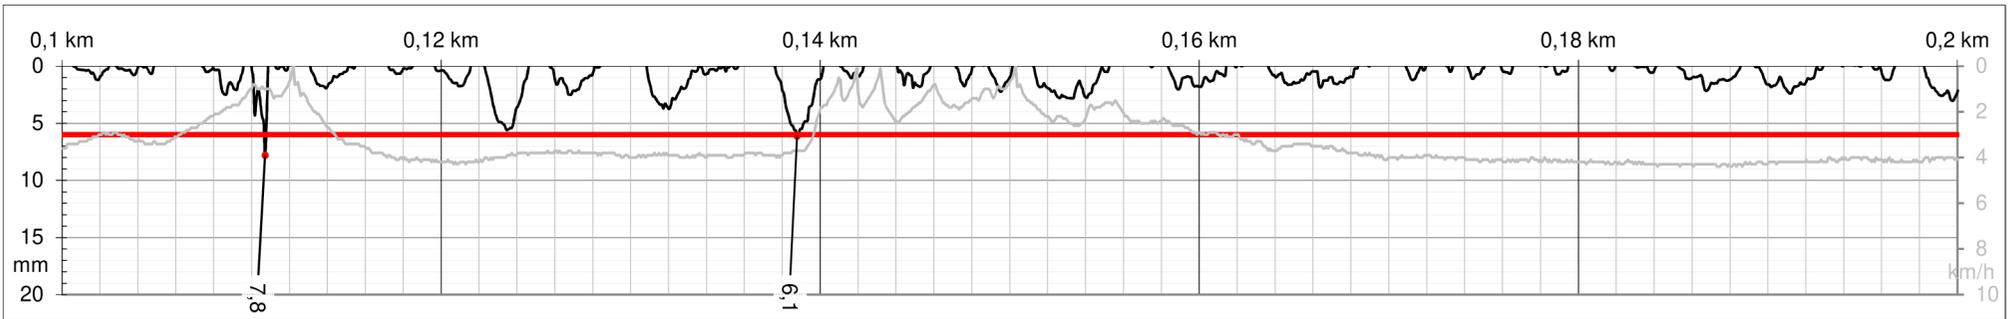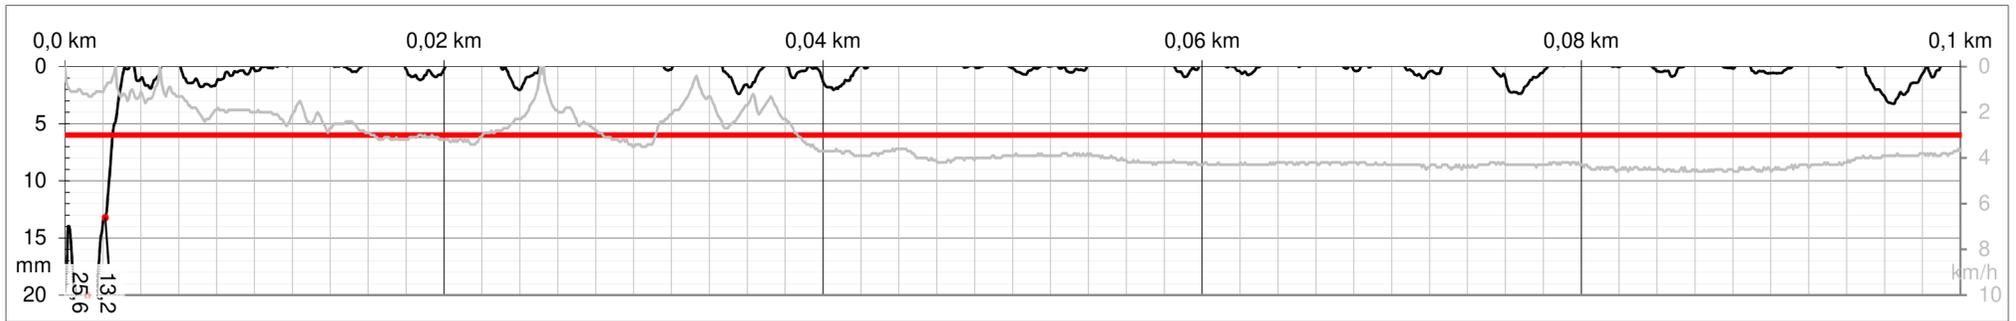

Anlage 1 zum Prüfbericht-Nr. 1992/22

